



第四區管理處 停水作業計畫

工程名稱：大肚區永順、成功、磺溪里文
昌路 2、3 段等代辦延管工程

台灣自來水公司
中華民國 115 年 5 月

台灣自來水公司第四區管理處停水作業計畫

目錄

一、前言.....	3
二、施工期間.....	3
三、停水日期.....	3
四、影響範圍.....	3
五、施作流程.....	3
六、供水調度因應作為.....	4
七、停水宣傳方式.....	4
八、其他事項.....	4
附錄(一) 台灣自來水公司第四區管理處停水報告單.....	5
附錄(二) 里長及相關單位協調連絡人員表.....	6
施工及停水訊息.....	8
施工地點示意圖.....	9
附件一、停水範圍.....	10
附件二、降壓範圍.....	11

一、前言

本工程施工地點位於大肚區，辦理大肚區永順、成功、磺溪里文昌路2、3段等代辦延管工程，為確保停水作業順暢，擬訂本作業計畫書作為施工依據。

二、施工期間

115年5月6日至115年6月5日，週一至週六當日8時30分至17時30分。施工中遇有不可抗拒因素停工或遇雨順延之狀況時，本停水計畫截止日順延。

三、停水日期

施工期間內配合工程進度，實際停水日期及時間於停水2天前刊登本公司停水公告查詢系統。非全時段連續停水，僅幹管改接及沿線用戶給水管改接時停水。

(一)幹管改接工程：影響用戶數約為292戶，每次停水自當日8時30分至17時30分。

(二)施工沿線用戶給水管改接工程：僅每日施工路段(約60~100公尺)周邊用戶停水(影響戶數約數15戶不等)，每戶停水自當日8時30分至17時30分。

四、影響範圍

(一)停水範圍(詳附件一)：

大肚區：成功里(部分)、山陽里(部分)、頂街里(部分)、永順里(部分)、磺溪里(部分)。

「萬興路以西、文昌路三段/永順路以東、萬興路以南、文昌路二段506巷以北。」


(二)水壓降低範圍(詳附件二)：

同停水範圍。

備註：實際停水及水壓降低範圍於停水2天前刊登本公司停水公告查詢系統。

五、施作流程

規劃預計辦理改善之區域管線設置位置後，報陳相關單位核定後，據以進場施作。現場施工順序如下：



六、供水調度因應作為

- (一)送水車按規劃路線填滿臨時供水站，並於復水前，裝滿管線末端與地勢較高致復水較慢地區用戶使用。
- (二)停水前應先儲滿各蓄（配）水池。
- (三)先將停水區內低地區與大用戶（每月用水超過一千度之非工業用水戶）、工業用水戶，有大蓄水池容易進水之管線先行關閉，盡量保持主幹管內之水量與水壓。
- (四)每日統計各項限水數據（用戶查詢電話、載水次數與數量等）。
- (五)載水站、載水車之指揮與管理。

七、停水宣傳方式

撰寫停復水施工停水訊息單，並於本公司網站上刊登停限水訊息，配合停水簡訊發送…等方式，告知用戶停水時程、停（復）水時應注意事項。

八、其他事項

- (一)為配合飲用水條例施行，施工完成後請加強排水清洗，以維用品品質，如因清洗不完全，所造成之損失，由承商負責。
- (二)承商先行規劃車行路線，置好交通錐、警示燈等措施，引導車輛行進方向，施工時應依規定作好一切工安措施，以確保工程及人員安全。
- (三)非全時段連續停水，僅幹管改接及沿線用戶給水管改接時停水，自當日 8 時 30 分至 17 時 30 分，請用戶利用晚上儲水備用。**
- (四)水量運送過程及復水調配水量須分段排氣，於恢復供水時，適逢用水尖峰期，大樓或用戶配水池及水塔須補滿水量，故管線末端或巷弄區域，擬依情況延後 2~4 小時恢復供水，敬請見諒。
- (五)敬請影響地區用戶儲水備用，節約使用，停水期間請關閉抽水馬達電源，以免空轉過熱損壞，施工、停水期間造成不便之處，敬請見諒。

台灣自來水公司第四區管理處停水報告單

(實際停水日期依工程進度刊登於本公司停水公告)

項 目	內 容
一、工程名稱	大肚區永順、成功、磺溪里文昌路 2、3 段等代辦延管工程【WQ-114-0428-0003】
二、施工地點及期間	施工地點：臺中市大肚區 施工期間自 115 年 5 月 6 日至 115 年 6 月 5 日，週一至週六當日 8 時 30 分至 17 時 30 分。
三、停水原因	辦理大肚區永順、成功、磺溪里文昌路 2、3 段等代辦延管工程路口改接(第一階段)
四、停水日期	施工期間內配合工程進度，實際停水日期及時間於停水 2 天前刊登本公司停水公告查詢系統。非全時段連續停水，僅幹管改接及沿線用戶改接時停水。 (一)幹管改接工程：影響用戶數約為 292 戶，每次停水自當日 8 時 30 分至 17 時 30 分。 (二)施工沿線用戶給水管改接工程：僅每日施工路段(約 60~100 公尺)周邊用戶停水(影響戶數約數 15 戶不等)，每戶停水自當日 8 時 30 分至 17 時 30 分。
五、影響範圍	停水範圍(詳附件一)： 大肚區：成功里(部分)、山陽里(部分)、頂街里(部分)、永順里(部分)、磺溪里(部分)。 「萬興路以西、文昌路三段/永順路以東、萬興路以南、文昌路二段 506 巷以北。」 水壓降低範圍(詳附件二)： 同停水範圍。 備註：實際停水及水壓降低範圍於停水 2 天前刊登本公司停水公告查詢系統。
六、減少供水量	預計減少供水量：584 立方公尺。
七、影響戶數	(一)幹管改接工程：約為 292 戶。 (二)施工沿線用戶給水管改接工程：僅每日施工路段(約 60~100 公尺)周邊用戶停水(影響戶數約數 15 戶不等)。
備 註	(一)倘遇雨或因特殊原因發生無法施工可能取消停水，待下次停水日期決定後，當再行通知。 (二)如工程提早完成則提早供水，倘工作發生特殊困難亦可能略延緩供水，停水不便之處，敬請見諒。 (三)若有任何停水問題請電洽(沙鹿營運所：04-26312127)或上本公司停水公告系統查詢。

廠所：沙鹿營運所

區處 操作課 業務課： 處長：

附錄(二) 里長及相關單位協調連絡人員表

台灣自來水公司第四區管理處「大肚區永順、成功、磺溪里文昌路2、3段等代辦延管工程」

里長及相關單位協調連絡人員表

項目	里別及相關單位	里長及連絡人	聯絡電話	連絡地址	備註
1	沙鹿營運所主任	李偉宏	(04)26312127	臺中市沙鹿區北勢東路 829 號	
2	沙鹿營運所工務股股長	黃啟聖	(04)26312127	臺中市沙鹿區北勢東路 829 號	
3	沙鹿營運所監造人員	熊哲堅	(04)26312127	臺中市沙鹿區北勢東路 829 號	
4	沙鹿營運所設計人員	黃品翰	(04)26312127	臺中市沙鹿區北勢東路 829 號	
5	冠僖工程有限公司	蔡能欽	(04)22653733	臺中市南區高工一街 69 號	
6	欣彰天然氣股份有限公司台中港營業所	黃義宏	(04)26623497#1790	臺中市沙鹿區中山路 493-13 號	
7	台灣電力股份有限公司台中區營業處	葉晉岳	1911	臺中市豐原區中正路 599 號	
8	中華電信股份有限公司台中營運處	鄭志斌	(04)2291-8175	臺中市西區市府路 37 號	
9	臺中市政府警察局	烏日分局 大肚分駐所	(04)2699-2167	臺中市大肚區遊園路 1 段 1 之 1 號	
10	臺中市政府警察局	烏日分局 龍井分駐所	(04)2635-3054	臺中市龍井區沙田路四段 245 號	
11	大肚區公所	邱智君	(04)26991105	臺中市大肚區沙田路二段 646 號	
12	成功里	陳聖文	04-26994676	臺中市大肚區成功里 8 鄰文昌路三段 335 巷 103 號	

13	永順里	陳秋益	04-26993577	臺中市大肚區永順里9鄰文昌路二段588巷6弄2號	
14	礮溪里	趙奕忻	04-26993773	臺中市大肚區礮溪里福興街26巷3號	
15	山陽里	黃冠陽	04-26990388	臺中市大肚區山陽里沙田路三段745巷10號	
16	頂街里	陳武徹	04-26993047	臺中市大肚區頂街里9鄰沙田路三段69號	

台灣自來水公司第四區管理處

◎ 施工及停水訊息 ◎

一、施工及停水緣由：

本公司為提供量足質優自來水，以提升民眾用水品質，辦理「大肚區永順、成功、磺溪里文昌路 2、3 段等代辦延管工程」，管線改接施工時，將造成部份區域停水，其停水區域、時間詳述於後。

二、施工期間：

115 年 5 月 6 日至 115 年 6 月 5 日，周一至周六當日 8 時 30 分至 17 時 30 分。施工中遇有不可抗拒因素停工或遇雨順延之狀況時，本停水計畫截止日順延。

三、停水日期：

施工期間內配合工程進度，實際停水日期及時間於停水 2 天前刊登本公司停水公告查詢系統。非全時段連續停水，僅幹管改接及沿線用戶改接時停水。

(一) 幹管改接工程：影響用戶數約為 292 戶，每次停水自當日 8 時 30 分至 17 時 30 分。

(二) 施工沿線用戶給水管改接工程：僅每日施工路段(約 60~100 公尺)周邊用戶停水(影響戶數約數 15 戶不等)，每戶停水自當日 8 時 30 分至 17 時 30 分。

四、影響範圍：

(一) 停水範圍(詳附件一)：

大肚區：成功里(部分)、山陽里(部分)、頂街里(部分)、永順里(部分)、磺溪里(部分)。

「萬興路以西、文昌路三段/永順路以東、萬興路以南、文昌路二段 506 巷以北。」

(二) 水壓降低範圍(詳附件二)：

同停水範圍。


1. 實際停水及水壓降低範圍於停水 2 天前刊登本公司停水公告查詢系統。
2. 施工期間受制水閥關閉影響，施工周邊地區管線壓力可能降低，部分地區管線末端可能有無水情況發生。
3. 影響時間：每日上午 8 時 30 分至下午 17 時 30 分，預計降壓 9 小時，管線巷道末端將延後 2 小時恢復。

註：水量輸送過程及復水調配水量須分段排氣，另恢復供水時，大樓及用戶配水池、水塔須補滿水量，故管線末端及巷弄恢復時間將略為延後。敬請影響地區用戶儲水備用、配合節約用水、關閉抽水馬達電源，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或火災並請飲用前先煮沸，造成不便之處，敬請見諒。

五、查詢電話：

沙鹿營運所	(04)2631-2127	客服中心	1910
施工進度查詢 冠僖工程有限公司: 04-2265-3733			

施工地點範圍簡示圖

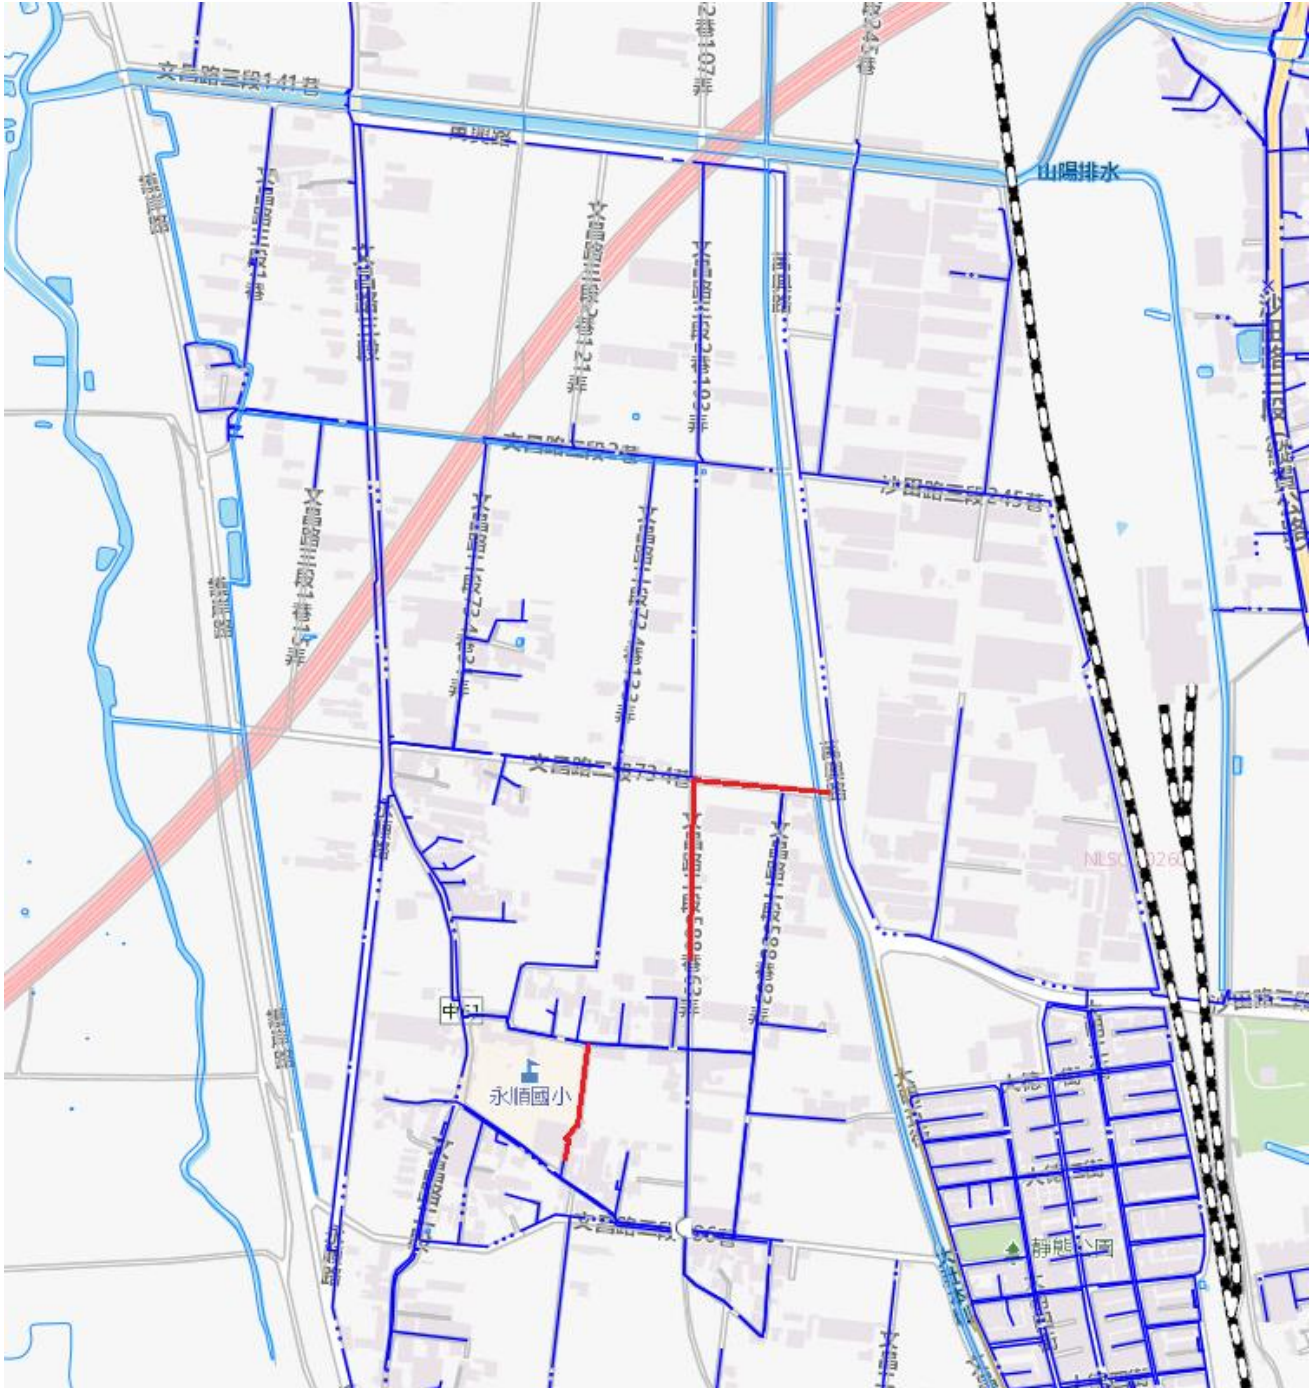

施工位置(紅線為埋管位置)

相關停水訊息請搜尋本公司停水公告查詢系統：<https://web.water.gov.tw/wateroff/>

欲訂閱停水通知，可掃描 Line QR code 或輸入電子信箱

台灣自來水公司 TAIWAN WATER CORPORATION

停水公告查詢系統

澎湖縣

基隆市

桃園市

新北市

新竹市

新竹縣

苗栗縣

宜蘭縣

臺中市

彰化縣

南投縣

花蓮縣

雲林縣

嘉義市

嘉義縣

臺南市

高雄市

屏東縣

臺東縣

▲ 紅色表示該縣市有災害停水事件

■ 綠色表示區域供水正常

● 黃色表示該縣市部分地區有停水或降壓事件

☎ 24小時客服專線：1910

申請停水通知 (另開新視窗)

地圖資訊版 (另開新視窗)

臨時供水站查詢 (另開新視窗)

供水現況回報 (另開新視窗)

民眾接收停水通知資訊

您可以掃描 Line QR code 訂閱停水通知

手機可直接點選連結

OR

輸入信箱登入或註冊

Mail

確定

☆ : ×

停水公告

台水公司停水公告查詢系統

好友人數 283,368

聊天 貼文

TaiwanWater @586zvzut

搜尋官方帳號

查看一覽 透過我的優惠券搜尋 用姓名搜尋
